

OA 平台项目管理需求规格书

文档名称:	OA 平台项目管理需求规格说明书
文档作者:	胡孟瑶
文档版本:	V1.0.0
编写日期:	2026-4-10

文档修订历史（需求变更记录）：

变更时间	变更提出人	变更类型	变更描述
2026.4.10	胡孟瑶	增加	增加

目 录

一、 功能性需求（产品经理填写）	4
1. 功能模板	4
2. 功能描述	5
2.1 界面整体布局介绍	5
2.2 项目排期功能	5
2.2.1 小组排期	5
2.2.2 项目总排期	8
2.2.3 任务依赖关系管理	12
2.2.4 备忘录	14
2.2.5 排期更改	15

一、功能性需求（产品经理填写）

1. 功能模板

功能模块	功能描述
界面布局	智慧可视化 OA 系统界面，列表展示项目
小组排期	组长仅可编辑本组排期；提交后进入项目经理审批；已审批可再次重新排期
项目总排期	自动汇总已审批小组排期；支持手动设置开始时间、自动计算完成时间（屏蔽节假日 / 周末）；可新增 / 删除行；按时间排序
任务关联	组长 / 项目经理可操作任务依赖关系；时间联动自动更新
备忘录	支持文本编辑、自动保存、垂直滚动条；支持插入图片，点击放大预览、可关闭
排期更改	已通过排期修改需重新审批；修改后自动同步并通知相关人员

2. 功能描述

2.1 界面整体布局介绍

- 1、登录智慧可视化 OA 系统，点击“项目管理”，项目以列表形式展现。
- 2、列表分为一级标题和二级标题。



2.2 项目排期功能

2.2.1 小组排期

- 1、入口：双击二级迭代项目名称，进入项目详情页，展示排期模块。
- 2、排期状态：各组排期状态分为未提交、审批中、已审批、已退回四个状态。



3、权限：

- (1) 组长仅可编辑、提交、撤销本小组的排期。
- (2) 组长可查看其他小组的排期（只读），以便了解协作方进度。
- (3) 项目经理拥有所有小组排期的查看、审批、重新排期权限。

4、表格功能：

- (1) 提供类 WPS :Excel 的在线 S 表格编辑体验，支持：单元格文本编辑、复制粘贴、单元格内换行、文字加粗/颜色。

基础编辑能力	单元格文本输入 / 修改 / 删除
	单元格内换行（快捷键：Alt + Enter）
	批量文本选中、复制（Ctrl+C）、剪切（Ctrl+X）、粘贴（Ctrl+V）
	撤销（Ctrl+Z）、重做（Ctrl+Y）
	单元格清空（Delete 键）
单元格格式设置	文字加粗（Ctrl+B）
	文字颜色设置（下拉选色板，同 Excel）
	单元格对齐方式：左对齐、居中对齐、右对齐
	单元格内容换行显示（自动换行 / 手动换行）
单元格操作	单击选中单个单元格
	拖动选中连续单元格区域
	单元格宽度 / 高度拖动调整（鼠标悬停边线→双向箭头→拖动）
	单元格内容拖动填充（同 Excel 填充柄）
表格行列操作	插入行
	删除行
	整行选中、整列选中
	行列隐藏 / 显示（按需支持）
	冻结行/列
下拉选择	单元格下拉选择框
	固定选项列表选择
	选择后自动填充单元格
数据操作	单元格内容复制到其他单元格
	多行多列区域复制 / 粘贴
	粘贴保留格式 / 纯文本粘贴（同 Excel 默认逻辑）
交互约束	所有操作快捷键、鼠标交互、视觉反馈与 Excel 完全一致
	编辑体验、光标样式、选中高亮、边线拖动效果对齐 Excel
	无自定义交互逻辑，研发按 Excel 标准交互实现

- (2) 自动保存：编辑过程中每 30 秒自动保存一次草稿。


- (3) 提交校验：排期内容为空时，禁止提交，提示“排期内容为空，请完善后提交”

5、提交：组长填写完成后点击提交，排期状态变为“审批中”，推送至项目经理审批，消息同步至钉钉“OA 助手中”，提交时始终取当前界面最新内容，自动保存仅为容灾备份。

6、撤销：在钉钉“OA 助手”消息卡片找到自己的流程，点击“撤销”按钮，二次确认后撤回排期。

- (1) 撤销触发条件：仅未审批的小组排期可撤回，排期通过审批后不可撤销，撤销按钮置灰。
- (2) 撤销后，平台排期状态从“审核中”变更为“未提交”。
- (3) 数据保留：撤销后排期内容全部保留，组长可直接修改后重新提交
- (4) 通知：撤销成功后，OA 助手向组长发送撤销成功通知；项目经理端同步移除该待审批项。

(5) 权限：仅提交该排期的组长本人可撤回，其他组长 / 项目经理无撤销权限

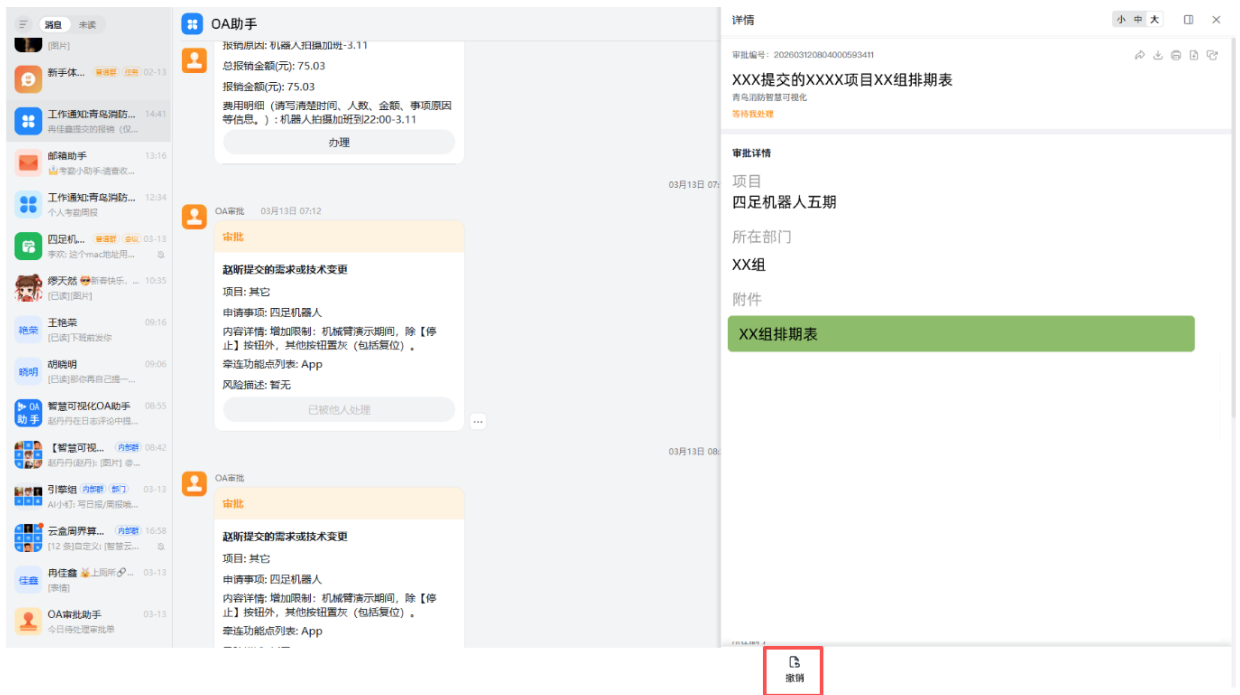

7、已审批排期修改与重审流程

(1) 本组排期状态为“已审批”时，组长仍可对排期表格进行编辑操作，编辑过程中沿用 30 秒自动保存草稿规则。

(2) 编辑完成后点击“提交”，排期状态自动变更为“审批中”，同步推送至项目经理审批，审批消息同步至钉钉“OA 助手”。

(3) 无内容变更重复提交时，系统弹窗提示：“无变更无需重复提交”，禁止提交。

(4) 项目经理审批通过后，排期状态恢复为“已审批”，修改后的内容自动同步至项目总排期表；项目经理审批“拒绝”后，排期状态变更为“已退回”，同步触发钉钉通知至组长。

8、并发控制：组长正在编辑本组已审批排期时，若项目经理点击“重新排期”，系统检测到该排期正在被编辑，弹窗提示项目经理：“当前排期正在被组长编辑中，启动重新排期将覆盖组长未提交的编辑内容，是否继续？”

项目经理点击“取消”：关闭弹窗，不触发重新排期，项目经理可等组长完成编辑后再操作。

项目经理点击“确认”：重新排期正式生效，组长当前页面弹出提示：“项目经理已发起重新排期，您当前的编辑内容已被覆盖，表格已更新为最新版本，请根据重新排期要求重新填写。”组长点击确认后，页面内容切换为重新排期后的最新版本。

若组长不在当前页面（离线或未打开排期页），则重新排期直接生效，组长下次进入排期页时弹出提示：“项目经理已发起重新排期，排期内容已更新，请根据要求重新填写并提交。”

9、审批中排期不可编辑，点击表格编辑时提示：审批中暂不可编辑。

青鸟消防 办公自动化系统

← 返回项目列表 四足机器人-四足机器人三期 迭代 里程碑 需求 任务 甘特图 缺陷 风险 排期

排期-引擎组排期

WBS表									
一：项目基本情况									
项目名称			M20协和医院四足机器人项目		项目版本		v1.1		
项目经理			XX		制表日期		XX		
二：工作分解结构 (R-负责 responsible; Jc-联调 Joint commissioning; A-辅助 Assist; Ap-审批 to approve)									
分解代码	任务名称 (以优先级排序)	包含活动 (如有前置任务, 请标明)	工时估算	人力资源(人数)	其他资源	赵丹丹	天然	刘云	XX
7	1.1	活动1							
8	1.2	活动2							
9	1.3	活动3							
10	1.4	活动4							
11	1.5	活动5							
12	2.1								
13	2.2								
14	2.3								
15	2.4								
16	2.5								
17	3.1								
18	3.2								
19	3.3								
20	3.4								
21	3.5								
22	4.1								

任务

- 年度目标
- 看板管理
- 项目管理
- 我的待办
- 日志
- 创建日志
- 我收到的
- 我发出的
- 云存储
- 绩效
- 绩效评定
- 绩效记录
- 绩效核算
- AI
- 智慧元境
- 其它
- 应用项目

保存

2.2.2 项目总排期

- 各个小组提交排期表格后，将自动触发审批流程。
- 项目经理查看并确认排期合理后点击“同意”，小组排期显示“已审批”并自动同步至“项目排期”总表。

OA助手

撤回原因: 机器人拍摄加速-3.11
总报金额(元): 75.03
报销金额(元): 75.03
费用明细 (请写清楚时间、人数、金额、事项原因等信息。): 机器人拍摄加速到22:00-3.11

办理

OA审批 03月13日 09:12

审批

赵斯提交的需求或技术变更

项目: 其它

申请事项: 四足机器人

内容详情: 增加限制: 机械臂演示期间, 除【停止】按钮外, 其他按钮置灰 (包括复位)。
连续功能点列表: App

风险描述: 暂无

已被他人处理

OA审批 03月13日 08:42

审批

赵斯提交的需求或技术变更

项目: 其它

申请事项: 四足机器人

内容详情: 增加限制: 机械臂演示期间, 除【停止】按钮外, 其他按钮置灰 (包括复位)。
连续功能点列表: App

OA审批助手 03-13 今日待处理事项

详情

审批编号: 202603120804000593411

XXX提交的XXXX项目XX组排期表

青岛消防智慧可视化

等待我处理

审批详情

项目
四足机器人五期

所在部门
XX组

附件
XX组排期表

退回 确认

- 若项目经理判定排期不合理，可点击“拒绝”，弹窗填写拒绝理由（必填，不可为空，限制 200 字符），退回理由为空时，“确定”按钮禁用。
- 填写完成后将任务退回至对应组长重新排期，OA 小组排期表后方显示“已退回”，钉钉自动通知该组组长：您的排期已被项目经理退回，请修改后重新提交。



5、已审批后再次退回：已审批通过的排期项目经理也可让组长重新排期。

- (1) 仅当该行排期状态 = “已审批”时，才显示“重新排期”按钮。
- (2) 此按钮仅项目经理可见、可操作，其他角色无查看与操作权限。
- (3) 点击“重新排期”按钮后，页面右侧滑出多行输入框（必填，限制 200 字符），弹框中包含“取消”按钮、“确定”按钮。重新排期要求为空时，“确定”按钮禁用。
- (4) 该小组排期状态由“已审批”变更为“已退回”。
- (5) 钉钉 OA 助手自动通知该组组长：

【项目排期重新调整通知】XX 项目 -XX 组：排期已被项目经理发起重新排期要求，当前排期已从项目总表中移除。请您根据以下要求完成排期调整后，重新提交审批：项目经理填写的重新排期要求。

- (6) 已退回小组排期对应的数据从项目总表中自动移除，待组长修改并重新审批通过后再同步回来。

6、总排期与小组排期双向联动规则：

（1）正向同步（总排期→小组排期）：

- ① 项目经理可在项目总排期表中新增空白行，填写任务详情后，在“负责人”列选择对应人（下拉菜单，可模糊搜索选择），填写完成后点击“保存”。
- ② 保存成功后，该任务行自动同步至负责人对应小组的排期表末尾，小组排期表中自动填充任务名称、工时、负责人等总表中填写的全部信息，保证与总排期表内容完全一致。
- ③ 同步至小组排期表的任务行，组长可编辑完善细节，编辑后需提交审批，审批通过后自动回同步至项目总排期表。
- ④ 仅项目经理新增的空白行任务可执行删除操作，系统自动同步的小组排期行不可删除。

（2）反向同步（小组排期→总排期）：

- ① 小组排期审批通过后，排期内容自动同步至项目总排期表；小组排期修改重审通过后，修改内容自动覆盖更新总排期表对应内容。
- ② 项目经理发起“重新排期”后，对应小组排期数据自动从总排期表中移除，直至重新审批通过后再次同步。

（3）数据一致性规则：

- ① 任务核心字段（任务名称、负责人、工时）以审批通过的最新版本为准，双向同步时保证字段完全一致。
- ② 任务依赖关系、备注信息等辅助字段同步更新，不出现数据偏差。

7、展示顺序：

- （1）默认按小组提交审批通过顺序展示。各小组排期状态变为“已审批”后，其内容自动追加至项目总排期表末尾。
- （2）项目经理可手动调整任务的开始时间，系统将根据该任务预估工时和工作日历，自动计算并填充完成时间。
- （3）总排期表默认按任务的开始时间升序排序。

8、时间计算：

- （1）项目经理通过时间选择器设置任务开始时间
- （2）系统根据小组提交的预估工时 / 周期，自动计算完成时间。

(3) 计算规则屏蔽周六日、法定节假日，仅计算工作日（节假日调休也需算在其中）。

(4) 未设置开始时间，不自动计算完成时间。

9、表格能力：与 WPS: XLSX 表格兼容，支持单元格编辑、复制、粘贴、换行、格式调整。

基础编辑能力	单元格文本输入 / 修改 / 删除
	单元格内换行（快捷键：Alt + Enter）
	批量文本选中、复制（Ctrl+C）、剪切（Ctrl+X）、粘贴（Ctrl+V）
	撤销（Ctrl+Z）、重做（Ctrl+Y）
	单元格清空（Delete 键）
单元格格式设置	文字加粗（Ctrl+B）
	文字颜色设置（下拉选色板，同 Excel）
	单元格对齐方式：左对齐、居中对齐、右对齐
	单元格内容换行显示（自动换行 / 手动换行）
单元格操作	单击选中单个单元格
	拖动选中连续单元格区域
	单元格宽度 / 高度拖动调整（鼠标悬停边线→双向箭头→拖动）
	单元格内容拖动填充（同 Excel 填充柄）
表格行列操作	插入行
	删除行
	整行选中、整列选中
	行列隐藏 / 显示（按需支持）
	冻结行/列
下拉选择	单元格下拉选择框
	固定选项列表选择
	选择后自动填充单元格
数据操作	单元格内容复制到其他单元格
	多行多列区域复制 / 粘贴
	粘贴保留格式 / 纯文本粘贴（同 Excel 默认逻辑）
交互约束	所有操作快捷键、鼠标交互、视觉反馈与 Excel 完全一致
	编辑体验、光标样式、选中高亮、边线拖动效果对齐 Excel
	无自定义交互逻辑，研发按 Excel 标准交互实现

10、项目排期表“行”操作功能：

(1) 总排期表允许新增空白行，并可删除新增的空白行。新增方式同 excel。

(2) 新增或删除需要填写理由，新增/删除后会钉钉通知相应人员（项目经理、负责人、负责人组长）

(3) 删除前需要检查任务是否存在依赖关系，如果有，删除后自动清除依赖关系。

11、支持表格保存与表格导出

(1) 自动保存：编辑过程中每 30 秒自动保存一次草稿。

(2) 手动保存：点击“保存”按钮，立即强制保存，弹窗提示“保存成功”。

(3) “保存”按钮联动通知流程，如果项目经理更改了表格内容，点击保存后会触发提示流程发送给相关责任人（负责人、负责人组长、项目经理）。新增任务同步至对应小组后，同步触发钉钉通知至该组组长，通知内容为：【项目任务新增通知】您好，项目经理在“XXX 项目”总排期表中为您组任务进行了更改，请您及时查看并完善排期信息。

(4) 导出：点击“导出”可导出 excel 表格至本地。带图片的备忘录/新增内容需要嵌入 excel 保证内容完整。

- ① 点击“选择依赖项”按钮后，鼠标移入列表框内的任务名称选项时，该选项背景高亮显示（高亮色采用系统主色浅色系），与未选中选项形成明确视觉区分。
- ② 点击高亮的任务名称选项后，完成依赖项选择，依赖任务列单元格内同步显示已选择的任务名称，同时系统自动保存该依赖关系配置

						开始时间	完成时间	工期
故障电弧	立项审批完成	黄喆	黄喆	选择依赖项	范文成	2025/2/10	2025/2/14	5
	堆叠可行性评估完成（产品需求同步产出）	黄喆	朱伟华	选择依赖项	王绘清, 李林	2025/2/10	2025/3/1	20
	算法精度优化（基于示波器）	黄喆	黄喆	选择依赖项	/	2025/2/12	2025/3/10	27
	硬件设计完成	黄喆	朱伟华	选择依赖项	王绘清	2025/2/27	2025/3/18	20
	软件开发完成	黄喆	黄喆, 刘小哲	选择依赖项	/	2025/2/10	2025/4/11	61
	样机调试完成	黄喆	黄喆, 朱伟华	选择依赖项	/	2025/3/29	2025/6/6	70
	样机电弧数据采集及算法迭代完成（基于板卡）	黄喆	黄喆	选择依赖项	/	2025/6/6	2025/6/16	11
	软件发版，交付样机	黄喆	黄喆	选择依赖项	/	2025/6/16	2025/6/25	10

	具体事项	项目经理	负责人	任务依赖关系	资源协助	计划	
						开始时间	完成时间
	立项审批完成	黄喆	黄喆	选择依赖项	范文成	2025/2/10	2025/2/14
	堆叠可行性评估完成（产品需求同步产出）	黄喆	朱伟华	选择依赖项	王绘清, 李林	2025/2/10	2025/3/1
	算法精度优化（基于示波器）	黄喆	黄喆	选择依赖项	/	2025/2/12	2025/3/10
	硬件设计完成	黄喆	朱伟华	选择依赖项	王绘清	2025/2/27	2025/3/18
	软件开发完成	黄喆	黄喆, 刘小哲	选择依赖项	/	2025/2/10	2025/4/11
	样机调试完成	黄喆	黄喆, 朱伟华	硬件设计完成	/	2025/3/29	2025/6/6
	样机电弧数据采集及算法迭代完成（基于板卡）	黄喆	黄喆	选择依赖项	/	2025/6/6	2025/6/16

- （4）编辑与删除交互：
- ① 已配置依赖项的单元格，鼠标悬浮时右侧显示“编辑”“删除”图标按钮。
 - ② 点击“编辑”按钮，重新唤起依赖选择列表框，可重新选择依赖项，选择完成后自动覆盖原有配置。
 - ③ 点击“删除”按钮，弹出二次确认弹窗，提示“确认删除该任务的依赖关系吗？删除后任务时间将不再联动更新”，确认后清空该任务的依赖配置，单元格恢复为“选择依赖项”按钮状态。

部门项目管理进度表

8010909

已完成进行中未启动延期暂停

小组	具体事项	项目经理	负责人	任务依赖关系	资源协助	计划进度			实际完成时间	延期天数	完成状态	完成进度
						开始时间	完成时间	工期				
算法组	立项审批完成	黄磊	黄磊	选择依赖项	范文成	2025/2/10	2025/2/14	5			已完成	100%
	地基可行性评估完成 (产品需求同步产出)	黄磊	朱伟华	选择依赖项	王德清, 李林	2025/2/10	2025/3/1	20			已完成	100%
	算法精度优化 (基于示波器)	黄磊	黄磊	选择依赖项	/	2025/2/12	2025/3/10	27			已完成	100%
	硬件设计完成	黄磊	朱伟华	选择依赖项	王德清	2025/2/27	2025/3/18	20			已完成	100%
	软件开发完成	黄磊	黄磊, 刘小智	选择依赖项	/	2025/2/10	2025/4/11	61			已完成	100%
	样机调试完成	黄磊	黄磊, 朱伟华	硬件设计完成	/	2025/3/29	2025/6/6	70			已完成	100%
	机用测试数据采集及算法迭代完成 (基于板卡)	黄磊	黄磊	选择依赖项	/	2025/6/6	2025/6/16	11			已完成	100%
硬件组	软件发布, 交付样机	黄磊	黄磊	选择依赖项	/	2025/6/16	2025/6/25	10			已完成	100%
	预研1: 确定传感器可用, 采购	张少川	范, 海军, 朱	选择依赖项	李林, 王德清	2024/12/13	2024/12/31	19			已完成	100%
	预研2: 热解电, 紫外探测能力达到研发中心水	张少川	范, 海军, 朱	选择依赖项	李林, 王德清	2025/1/1	2025/1/27	27	2025/2/13	17	已完成	100%
	预研3: 探测能力全面优于同类产品	张少川	范, 少川, 朱	选择依赖项	李林, 王德清	2025/2/14	2025/3/28	43			已完成	100%
	第一版外观评审	张少川	张少川	选择依赖项	赵, 天, 付, 王	2025/1/10	2025/1/20	11			已完成	100%
	第二版外观设计完成 (详细尺寸)	张少川	付国瑞	选择依赖项	朱伟华	2025/1/20	2025/1/24	5	2025/3/14	49	已完成	100%
	硬件原理图+PCB	张少川	张少川	选择依赖项	朱伟华, 王德清	2025/1/20	2025/2/14	26			已完成	100%
	制版、焊接、调试	张少川	张少川	选择依赖项	朱伟华, 王德清	2025/2/14	2025/3/28	15			已完成	100%
	软件算法测试同时调整板卡	张少川	张少川, 范	选择依赖项	朱伟华, 王德清	2025/3/10	2025/3/28	19			已完成	100%
	第二版制版、焊接、调试	张少川	张少川	选择依赖项	朱伟华, 王德清	2025/3/31	2025/4/17	18			已完成	100%
	防暴证测试(自测)	张少川	张少川	选择依赖项	朱伟华, 王德清	2025/4/18	2025/5/18	31			已完成	100%

备忘录导出保存

2.2.4 备忘录

- 1、点击“备忘录”按钮后，页面弹出全屏编辑大白板（与系统日报编辑模式完全一致），大白板顶部显示标题“XXX 项目-备忘录”，底部设置“关闭”“保存”按钮。
- 2、编辑能力：

（1）大白板主体为多行文本输入框，自带垂直滚动条，内容超长时滚动展示，支持手动输入、修改、清空文本内容，支持文本加粗、颜色、换行、段落调整等基础格式编辑。

（2）支持插入 JPG/PNG/GIF 格式图片，单张图片≤20MB，；非图片格式 / 超出大小限制禁止上传，提示：“仅支持 JPG/PNG/GIF 格式，单张不超过 20MB”

（3）图片点击可放大预览，预览弹窗支持关闭。
- 3、保存规则：

（1）编辑过程中每 30 秒自动保存一次草稿，避免内容丢失。

（2）点击“保存”按钮，立即强制保存全部内容，弹窗提示“保存成功”，同时关闭大白板，返回项目总排期页面。

（3）点击“关闭”按钮，关闭大白板。点击'关闭'按钮时，若存在未保存的内容变更，系统弹窗提示：'当前有未保存的内容，是否保存后关闭？'提供'保存并关闭'与'直接关闭'两个选项。
- 第 14 页

智慧印务

办公自动化系统

返回项目列表

四星机器人

四星机器人

迭代

里程碑

需求

甘特图

缺陷

风险

排期

项目排期

任务

年度目标

看板管理

项目管理

我的待办

日志

创建日志

我收到的

我发出的

云盘存档

绩效

绩效评定

绩效记录

绩效核算

AI

智慧环境

其它

应用项目

部门项目管理进度表

80

10

9

0

9

已完结

进行中

未启动

延期

暂停

项目开始时间: ##/##/##

项目名称	具体事项	项目经理	负责人	任务依赖关系	资源协助	计划进度			实际完成时间	延期天数	完成状态	完成进度
						开始时间	完成时间	工期				
故障处理	立案审批完成	黄磊	黄磊		范文成	2025/2/10	2025/2/14	5			已完成	80%
	增强可行性评估完成 (产线需求同步产出)	黄磊	朱伟华		王旭浩, 李林	2025/2/10	2025/3/1	20			已完成	80%
	脚本精度优化 (基于示波器)	黄磊	黄磊		/	2025/2/12	2025/3/10	27			已完成	
	硬件设计完成	黄磊	朱伟华		王旭浩	2025/2/27	2025/3/10	20			已完成	
	软件开发完成	黄磊	黄磊, 刘小雷		/	2025/2/10	2025/4/11	61			已完成	
	接口测试完成	黄磊	黄磊, 朱伟华		/	2025/3/28	2025/6/6	70			已完成	
	部门数据同步完成及算法迭代完成 (基于版本)	黄磊	黄磊		/	2025/6/6	2025/6/16	11			已完成	
智慧带锯-SF-ex	软件发布, 交付带锯	黄磊	黄磊		/	2025/6/16	2025/6/25	10			已完成	
	预算1: 确定带锯器可用, 采购	张少川	范, 海平, 朱		李林, 王旭浩	2024/12/13	2024/12/31	19			已完成	
	预算2: 热解电, 紫外探测能力达到研发中心水平	张少川	范, 海平, 朱		李林, 王旭浩	2025/1/1	2025/1/27	27	2025/2/13	17	已完成	
	预算3: 探测能力金属优于同类产品	张少川	范, 少川, 朱		李林, 王旭浩	2025/2/14	2025/3/28	43			已完成	
	第一版外观设计	张少川	张少川		赵, 天, 付, 王	2025/1/10	2025/1/20	11			已完成	
	第二版外观设计完成 (详细尺寸)	张少川	付慧娟		朱伟华	2025/1/20	2025/1/24	5	2025/3/14	49	已完成	
	硬件原理图+PCB	张少川	张少川		朱伟华, 王旭浩	2025/1/20	2025/2/14	26			已完成	
	制版, 焊接, 调试	张少川	张少川		朱伟华, 王旭浩	2025/2/14	2025/2/28	15			已完成	
	软件算法测试及时间逻辑验证	张少川	张少川, 范		朱伟华, 王旭浩	2025/3/10	2025/3/28	19			已完成	
	第二版制版, 焊接, 调试	张少川	张少川		朱伟华, 王旭浩	2025/3/31	2025/4/17	18			已完成	
影像证据整理归档	张少川	张少川		朱伟华, 王旭浩	2025/4/18	2025/5/18	31			已完成		

备注

导出

保存

2.2.5 排期更改

1、小组排期修改

- (1) 未提交、已退回状态的小组排期，组长可直接编辑修改，完成后提交审批。
- (2) 已审批状态的小组排期，组长可直接编辑修改，修改完成后点击提交，排期状态变更为“审批中”，重新触发审批流程；无变更内容重复提交，系统提示：“无变更无需重复提交”，禁止提交。
- (3) 项目经理审批通过后，修改后的排期生效，自动同步至项目排期总表；项目经理审批“拒绝”后，排期状态变更为“已退回”，同步触发钉钉通知至对应组长。
- (4) 审批中状态的排期不可修改，仅提交人可撤销，撤销后状态变更为“未提交”，可重新编辑。

2、项目总排期修改

- （1）项目经理可修改总排期表中已审批任务的时间、内容等信息，手动点击“保存”后，系统自动同步更新全表对应数据，同时通过钉钉“OA 助手”通知相关人员（任务负责人、负责人所在组组长、项目经理）。
- （2）项目经理在总排期表新增任务并指定负责人后，保存成功自动同步至负责人对应小组排期表，同时触发钉钉通知相关人员（任务负责人、负责人所在组组长、项目经理）。
- （3）总排期表中系统自动同步的小组排期行不可删除，仅项目经理新增的空自行可执行删除操作。
